



“ कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार समृद्ध गंगाजमुनाको मूल आधार ”

गंगाजमुना गाउँपालिकाको वार्षिक प्रगति समिक्षा आ.व. २०७९/०८०

प्रस्तुतकर्ता
युवराज थपलिया
योजना तथा अनुगमन शाखा₁



नमस्कार



संक्षिप्त परिचय

- धादिङ्ग जिल्लाको उत्तर पश्चिमा अवस्थित यस गाउँपालिका साविकको री, गुम्दी, फूलखर्क, बसेरी र बुढाथुम गरी ५ वटा गाविस मिलेर बनेको हो ।
- गंगाजमुनामाई मन्दिर तथा भरनाको नामबाट गाउँपालिकाको नामकरण गरिएको ।
- गाउँपालिका जिल्लाको सदरमुकामदेखि ५४ कि.मि.को दुरीमा पर्दछ ।
- गाउँपालिकाको कुल क्षेत्रफल १४४.०९ वर्ग कि.मी. रहेको छ । जनसंख्या २१७८४ (वि.स. २०६८ को जनगणना), घरधुरी ५७१८ यस गाउँपालिकाको
 - पूर्वमा : खनियाबास गाउँपालिका,
 - पश्चिममा : गोरखा जिल्लाको आरुघाट गाउँपालिका,
 - उत्तरमा : रुविभ्याली गाउँपालिका र गोरखा जिल्ला
 - दक्षिणमा : नेत्रावती तथा त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका
- भौगोलिक रूपमा मध्यपहाडी क्षेत्र देखि हिमाली क्षेत्रसम्म फैलिएको यस गाउँपालिका जैविक, विविधता, प्राकृतिक स्रोत तथा पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण रहेको छ ।
- खेती गरिएको जमिन : ४३.०६, चट्टान : ५.६९
- वनजंगलले ढाकेको जमिन : २५.११, खर्क तथा चरन क्षेत्र : २२.४
- आवास क्षेत्र : २.०३, बगर नदी ताल खोला : ४०.७८
- १३ वटा धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलहरु रहेको ।
- गाउँपालिकामा ४३ वटा सामुदायिक विद्यालयहरु रहेको (११ वटा माध्यमिक, ३२ वटा आधारभूत र .. वटामा बाल विकास केन्द्र)
- ७३.१ प्रतिशत जनसंख्या साक्षर छन् ।
- कुल ३७,८७२ हेक्टर जमिनमा १९२६ हेक्टर जग्गा कृषिको लागि उपयोग गरिएको ।

२०७१/०८० मा सञ्चालित योजनाको विवरण

योजना	वडास्तरीय	पालिकास्तरीय	जम्मा संख्या	सम्पन्न भएका	क्रमागत
१ लाखभन्दा कम	१६	०	१६	१६	०
१-५ लाखसम्म	१११	१२	१२३	१२३	०
५-१० लाखसम्म	१७	७	२४	२४	०
१० – ५० लाखसम्म	४	१४	१८	१८	०
५० लाखभन्दा माथि	०	१७	१७	१७	३
कूल जम्मा	१४८	५०	१९८	१९५	३

३ वटा क्रमागत योजना

उपभोक्ता अभिमुखिकरण गोष्ठी -६ वटा ३६३ जना

भुक्तानी बाकी योजना : उ.स. ३ ठेक्का ६ वटा

सहकारी

क्र.सं	सहकारीको नाम	ठेगाना	अध्यक्षको	
			नाम	फोन
१	श्री रि गाउ कृषि सहकारि संस्था	गंगाजमुना .-1	केसार्की तामाङ	९८४१०३०६९४
२	श्री नमस्ते व्यवसायिक महिला वचत तथा ऋण स.स. लि	गंगाजमुना .-2	प्रेमकुमारी तामाङ	९८४६३०८३७७
३	श्री पासाङ चोक कृषि सहकारि संस्था लि.	गंगाजमुना .-2	कान्छा वहादुर तामाङ	९८६४२९५५११
४	❖ श्री तारेढुङ्गा कृषि सहकारि संस्था लि.	गंगाजमुना .-2		
५	श्री रि साना किसान कृषि सहकारि संस्था लि.	गंगाजमुना .-2	प्रेम कुमारी तामाङ	९८४६३०८३७७
६	श्री मेगा साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि.	गंगाजमुना .-4	रत्नमाया घले	९८४०३२२६२४
७	❖ श्री गुम्दि कृषि सहकारि संस्था लि.	गंगाजमुना .-4	दुर्गावहादुर घले	
८	श्री चेतनशिल ग्रामिण विधुत सहकारि संस्था लि.	गंगाजमुना .-5	खिल वहादुर अधिकारी	९८४७६८९२७०
९	श्री छहारी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.	गंगाजमुना .-5	रामेश्वर अधिकारी	९८४३३०१०२९

क्रमसं

क्र.सं	सहकारीको नाम	ठेगाना	अध्यक्षको	
			नाम	फोन
११	श्री फुलखर्क कृषि सहकारी संस्था लि.	गंगाजमुना .-5	चुडामणि नेपाल	९८४१६५८९२६
१२	❖ श्री माँ कल्याणी बचत तथा ऋण सहकारि संस्था लि.	गंगाजमुना .-5		
१३	श्री गंगाजमुना सामाजिक उधमि महिला सहकारि संस्था लि.	गंगाजमुना .-5	निर्मला घले	
१४	❖ श्री महालक्ष्मि कृषि बहुउद्देशिय सहकारि संस्था लि.	गंगाजमुना .-6	इन्दिरा ढकाल	
१५	श्री वसेरि साना कुसान कृषि सहकारि संस्था लि.	गंगाजमुना .-6	दल सिंह नेपाली	९८०८७०९६३६
१६	श्री शहिद स्मृति कृषि बहुउद्देशिय सहकारि संस्था लि.	गंगाजमुना .-6	एकिकणा श्री समाज विकास सग	
१७	श्री उग्रचण्डि साना कुसान कृषि सहकारि संस्था लि.	गंगाजमुना .-7	सत्यदेवी रेग्मी	९८६०४७२८२२
१८	श्री समाज विकास बहुउद्देशिय सहकारी संस्था लि.	गंगाजमुना .-7	प्रेम बहादुर खड्का	९८०८५११११८
१९	श्री गंगाजमुना एगो बहुउद्देशिय सहकारि संस्था लि.	गंगाजमुना .-7	रामचन्द्र श्रेष्ठ	९८१८८४५२४१ ⁶

खानेपानी दर्ता

सि.नं.	दर्ता नं.आ.व मिति	उपभोक्ता समितिको नाम	ठेगाना	मुलको नाम	अध्यक्षको नाम
1	2077/78-06	घ्याङखोला खानेपानिको उपभोक्ता समिति	गंगाजमुना -6	घ्याङखोला मुहान	दिपक बहादुर गुरुङ
2	2077/78-06	छेलाङ खानेपानि तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति	गंगाजमुना -3	मस्यु खोला मुहान	लक्ष्मण गुरुङ
3	2077/78-8	बर्धन खानेपानि उपभोक्ता तथा सरसफाई समिति	गंगाजमुना -3	छ्याङ छ्याङ खेत मुहान	तुल बहादुर गुरुङ
4	2077/78-9	साँघि खोला खिरबोट खानेपानि उपभोक्ता समिति	गंगाजमुना-6	साँघि खोला मुहान	उत्तम बहादुर कार्कि
5	2077/78-10	तावल गाँउ खानेपानि तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति	गंगाजमुना -2	आखुखोला मुहाल	तर लामा तामाङ
6	9/28/2077	ओजकि खाने पानि तथा सरसफाई उ.स.	गंगाजमुना-4	गुम्दि ढाप खोला	शंखर प्रसाद सिंखडा
7	1/5/2078	कैचेल धारा ठुलो धारा फुलखर्क खानेपानि उपभोक्ता समिति	गंगाजमुना -5	कैचल धारा ठुलो धारा मुहान	भिम बहादुर अधीकारि
8	2/18/2077	क्युरिनि ढाप खानि गाउँ खानेपानि तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति	गंगाजमुना-7	बुद्धाथुम खत्रि गाउँ क्युरिनि ढाप	जनक बहादुर खत्रि
9	2076/77-02	लुम्भि काँसधारि खानेपानि तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति	गंगाजमुना-4	लुम्भि कासधारि मुहान	चुर्ण बहादुर घले
10	2076/77-03	चिसे खोला कैचलबोट खानेपानि तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति	गंगाजमुना-5	चिसे खोला कैचलबोट मुहान	उत्तर बहादुर भुजेल
11	2077/78-04	चिसा पानि बसेरि खानेपानि तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति	गंगाजमुना-6	चिसापानि वसेरि मुहान-6	भरत बहादुर ढकाल
12	4/25/2077	डिलि खानेपानि तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति	गंगाजमुना-4	डिलि खानेपानि मुहान-4	निल कुमार लामिछाने
13	2/18/2078	साल्दुम गुम्दि मष्टमण्डलि खानेपानि तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति	गंगाजमुना-3	आल्चेतकुना भर्चेल खाङखोला मुहान	राम बहादुर गुरुङ

खानेपानी दर्ता

सि. नं.	दर्ता नं.आ.व मिति	उपभोक्ता समितिको नाम	ठेगाना	मुलको नाम	अध्यक्षको नाम
14	3/15/2078	गलले बेशि खानेपानि तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति	गंगाजमुना-7	ठुलो पधेरा	वुद्धि प्रसाद ढकाल
15	3/15/2078	अधेरि खोला खानेपानि आयोजना	गंगाजमुना-7	अधेरि खोला	भुवन बहादुर अधिकारि
16	4/26/2078	गुम्दि खानेपानि उपभोक्ता समिति	गंगाजमुना-3	मन्नाड केवर कुना	दल बहादुर घले
17	078/79/17	काल सि. खानेपानि उपभोक्ता समिति	गंगाजमुना-6	काल सि.मुहान	रमेश घले
18	078/79-18	लसुन फेदि भंगेरि खानेपानि उपभोक्ता समिति	गंगाजमुना-6	चिसापानि मुल	ओम प्रसाद घले
19	078/79/18	अँधेरि खोला खानेपानि तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति	गंगाजमुना-7	अँधेरिखोला	नविन श्रेष्ठ
20	078/79/20	पात्ले खर्क लप्सि खोला मुहान खानेपानि उपभोक्ता समिति	गंगाजमुना-5	पात्ले खर्क लप्सि खोला मुहान	शम्भु सिंखडा
21	079/79/21	अधेरि खोला खोप कुलो सिंचाई योजना	गंगाजमुना-7	अधेरि खोला	डिल बहादुर आले मगर
22	078/79/22	चोके खानेपानि तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति	गंगाजमुना-1	तङ्कि मुहान	बम लामा तामाङ
23	078/79/23	इवि खानेपानि तथा सरसफाई उ.स	गंगाजमुना-1	इवि मुहान	टेकु लामा तामाङ
24	078/79/24	हिले मचेत खर्क अरुवोटे खानेपानि उ.स	गंगाजमुना-6	हिले	मैते घले
25	079/80/25	एसेलु फेद मुहान भुतेको छांगो मुनिको मुहान खाने पानि उपभोक्ता समिति	गंगाजमुना-7	एसेलु फेद मुहान र भुते छांगा मुनि मुहान	गोपाल बहादुर अधिकारि

वार्षिक कार्ययोजना

योजना / उद्योग / सहकारी शाखा

क्र.स.	योजना तथा कार्यक्रमको नाम	कार्यान्वय गर्ने तरिका कार्यविधि भए उल्लेख गर्ने	योजना तथा कार्यक्रम सुरु गर्ने मिति	योजना तथा कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने मिति	कैफियत
१	कोपोमिस नेतृत्व विकास र लेखापालन तालिम प्रदान		२०८० भाद्र	२०८० फागुन	
२	सहकारी संस्थाहरुको अनुगमन		२०८० भाद्र	२०८१ जेष्ठ	
३	गंगाजमुना गाउँपालिकामा दर्ता भएका व्यवसायहरुको अनुगमन र नविकरण		२०८० भाद्र	२०८० असोज	अनुगमन २०८१ जेष्ठ सम्म
४	गंगाजमुना गाउँपालिकामा बजारमा अनुगमन	कार्यविधि भएको	२०८० भाद्र	२०८१ जेष्ठ	
५	उ. स. अभिमुखिकरण गोष्ठी		२०८० असोज	२०८० असोज	
६	योजना सम्झौता		२०८० कार्तिक	२०८० मंसिर	
७	योजनाको कार्यसम्पन्न गर्ने			२०८० चैत्र	
नोट : कार्यपालिकाको निर्णय आवश्यक पर्ने					


सारशँ

१. बजार अनुगमन -२ स्थान (गुम्दि र फुलखर्क)
२. सहकारि अमुगमन -४ वटा (वसेरि साना किसान , समाज विकौश, गंगाजमुना एग्री, स्वर्णिक वचत तथा ऋण)
३. सहकारि संस्था -१९ वटा (१-१९) यस आ.व.मा - ०
४. व्यवसाय दर्ता -५१७ वटा (१-५१७) यस आ.व.मा-३९
५. यस आ.व.मा उ.स.दर्ता -४९ वटा (१-४९) यस आ.व.मा -२४
६. संघ संस्था दर्ता -६
७. जल उपभोक्ता समिति दर्ता -२६ वटा (१-२६) यस आ.व.मा -१

इन्सवाद



प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम



वार्षिक समीक्षा २०७९/०८०


आ.व. २०७९/०८० को विनियोजित बजेट

नेपाल सरकार




✓ ३०,४८,०००

विश्व बैंक(आई.डि.ए.)



✓ २४,५१,०००



जम्मा: ५४,९९,०००

नेपाल सरकार तथा युवा रोजगारीका लागि रूपान्तरण पहल आयोजनाहरु -

क्र. स.	योजना तथा कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट	खर्च रकम	संलग्न कामदारको संख्या
१.	गोर्था खोला-सितला देवि आ.व. सम्म गोरेटो बाटो निर्माण ।	454190.88	452920	7
२.	अमुचेत- काइगड-सप्किचो गोरेटो बाटो निर्माण ।	369582.72	367744	7
३.	आरुखेत, बर्दन, छेलाड, मम्मै गोरेटो बाटो निर्माण ।	453724.44	403166	7
४.	रातमाटे, रातोडाँडा, सिस्ने,बगुवा गोरेटो बाटो निर्माण ।	284731.2	258638	7
५.	मजुवा बेशी भङ्केली गोरेटो बाटो निर्माण ।	179761.92	178464	5
६.	ढापाचौर देखि कैचैले धारा तेस्रो बाटो ठोड्ने पानी भदौरे गोरेटो बाटो निर्माण ।	259178.4	258502	5
७.	महभिर गोरेटो बाटो निर्माण । (महभिर पातल देखि बलरामको खेत सम्म)	149147.23	147841	5

८.	भैसे पुछारटोल, हस्तेटोल, कल्याणटोल हुँदै सिरान टोल गोरेटो बाटो निर्माण।	149934.096	143312	5
९.	अन्नपूर्ण मन्दिर डाँडा घर पछाडी हुँदै माझीखोला गोरेटो बाटो निर्माण।	333122.43	331240	5
१०.	कार्तिके पुरानो धारो गोरेटो बाटो निर्माण।	149988.29	149464	5
११.	तिदु चौतारा सति डाँडा, भरड डाँडा टुनीफेद गोरेटो बाटो निर्माण।	129892.04	127899	5
१२.	बाँसखर्क मरनघाट गोरेटो बाटो निर्माण।	129803.5886	129251	5
१३.	कम्चोक घरचेत गोरेटो बाटो मर्मत।	347274.72	345774	7
१४.	अष्ट्यारो सडक सोलिड, गंगाजमुना-२	282297.6	280540	2
१५.	चिम्चोक, पोखरा, भिरकुना, गुम्दी र सिम्जाङ गोरेटो बाटो मर्मत।	347270.664	343238	7

१६.	साल्दुम थोपा सिँचाई पाइप लाईन मर्मत।	218293.92	210574	3
१७.	कटुवा चौतारा चारमुरे सिढी मर्मत।	163537.9	162848	3
१८.	ढाडखर्क गंगाजमुना सिढी मर्मत।	169135.2	167783	3
१९.	हटिया डाँडा चौतारो मर्मत तथा पधँरो सम्म मटरा खेत देखि गौथलि पोखरी सम्म ठाडो बाटो मर्मत।	118261.37	118232	3
२०.	अधैरी परिवार टोल देउराली हुँदै महालक्ष्मी सम्म गोरेटो बाटो मर्मत।	164360.05	162308	3
२१.	बाँसपटे चिन्ने खोला हुँदै तिदुफेद, भंगेरी गोरेटो बाटो मर्मत।	159968.64	159942	3
२२.	छाँप मानेस्वाँरा गोरेटो बाटो मर्मत।	159763.5282	157914	3
२३.	सिम्ले मरनघाट गोरेटो बाटो मर्मत।	198662.88	198406	3
	जम्मा रकम	5371883.707	5256000	108

उपलब्धी --

सम्पूर्ण वडाहरूमा आयोजना संचालन पश्चात गोरेटो बाटो गाउँ बेसी लगायत घाँस दाउरा देखि लिएर गाइ वस्तुलाई चरण क्षेत्रको लागि सुविधा हुनुको साथै बर्खायाममा उकाली ओराली गर्न सहज भएको छ।

असल अभ्यास --

सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई रोजगारीमा सलग्न गराउन उत्प्रेरित गर्नु। स्वदेशमै स्वरोजगार बनाई भनी प्रोत्सान गरौं र हरेक श्रमको सम्मान गरौं।

नियमित कार्यहरू --

बेरोजगार सूची अद्यावधिक गर्नु बेरोजगार आयोजनाहरू लाई नियमित रुपमा अनुगमन निरिक्षण गरिनु

समस्याका र चुनौतीहरू--

नेपाल सरकारले तोकेको ज्यालादरमा श्रमिकलाई काममा लगाउँदा कामको गुणस्तर नहुनु र अनुगमन निरिक्षणको क्रममा गुणस्तर युक्त काम खोजिनु।

समस्या समाधान/ सुझाव--

गाउँपालिका तथा वडाबाट विनियोजन भएको बजेटसंग वडा कार्यलयले रोजगारमुलक आयोजनासंग साझेदारी गर्नको लागि पहल गरिने हो भने रोजगारमुलक आयोजनाले निरन्तरता पाउने सम्भावना देखिन्छ।

फोटोहरु:



फोटोहरु:



पुनःएकीकरण -

क्र. स.	रकम विनियोजन गर्ने निकाय	योजना तथा कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट	खर्च रकम	लाभाम्वित संख्या
१.	स्थानीय तहको रकम	प्लम्बिङ र हाउस वाइरिङ	५०,००० ।	५०,००० ।	४०
२.	वैदेशिक रोजगार बोर्डको रकम		१७,२०,००० ।	१७,२०,००० ।	
जम्मा रकम:			१७,७०,००० ।	१७,७०,००० ।	

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिहरूलाई विशेष प्रथामिकता दिई उनीहरूले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा सिकेका सीप, पुँजी, र प्रविधिलाई राष्ट्र हितको लागि उपयोग गर्न तथा क्षमता अभिवृद्धि गराउनलाई स्थानीय तहबाट संचालित १६० घण्टे हाउस वाइरिङ र प्लम्बिङ सम्बन्धित तालिम प्राप्त प्रशिक्षकबाट संचालन भएको २१ दिने उक्त विषयको सिप सिकाई सम्बन्धि ४० जना लाभग्राहीहरूलाई सो तालिम दिई उनीहरूलाई दैनिक जिवनमा घरायसी लगायत श्रम बजारमा गएर समेत काम गर्नको लागि सहज र सक्षम बनाइएको अनुभूति भएको छ।

प्लम्बिङ र हाउस वारिङ ट्रेनिङको फोटोहरु:




प्लम्बिङ र हाउस वारिङ ट्रेनिङको प्रमाण पत्र विवतरणका फोटोहरु:



धन्यवाद !




आ.व.२०७९/०८० को खर्चको अवस्था





❖ कुल अनुमानित बजेट रु	५९८७३२२४६.००
❖ प्राप्त बजेट रु	५६५३९७३१२.४१
❖ कुल खर्च रु	४८४६४८५८६.००
❖ खर्च प्रतिशत	८०.९४%

क्षेत्रगत खर्च बाँडफाँट




क्र.स	बिषयगत क्षेत्र	बिनियोजित	खर्च	खर्च प्रतिशत
१	आर्थिक विकास क्षेत्र	४३००००००.००	२८१५३०७३.००	६५.४७%
२	पूर्वधार विकास क्षेत्र	१७३५८२३००.००	१२७६९४४००.००	७३.५७%
३	सामाजिक विकास क्षेत्र	२५९७०१०००.००	२३९१९१९७५.००	९२.१%
४	सुशासन तथा अन्तर सम्बन्धित क्षेत्र	३८०००००.००	११८२१००.००	३१.११%
५	कार्यालय संचालन तथा प्रशासनिक क्षेत्र	९५४४८९८७.००	७००५७१५३.००	७३.४%


विषय क्षेत्रगत खर्च



विषय क्षेत्रगत खर्च

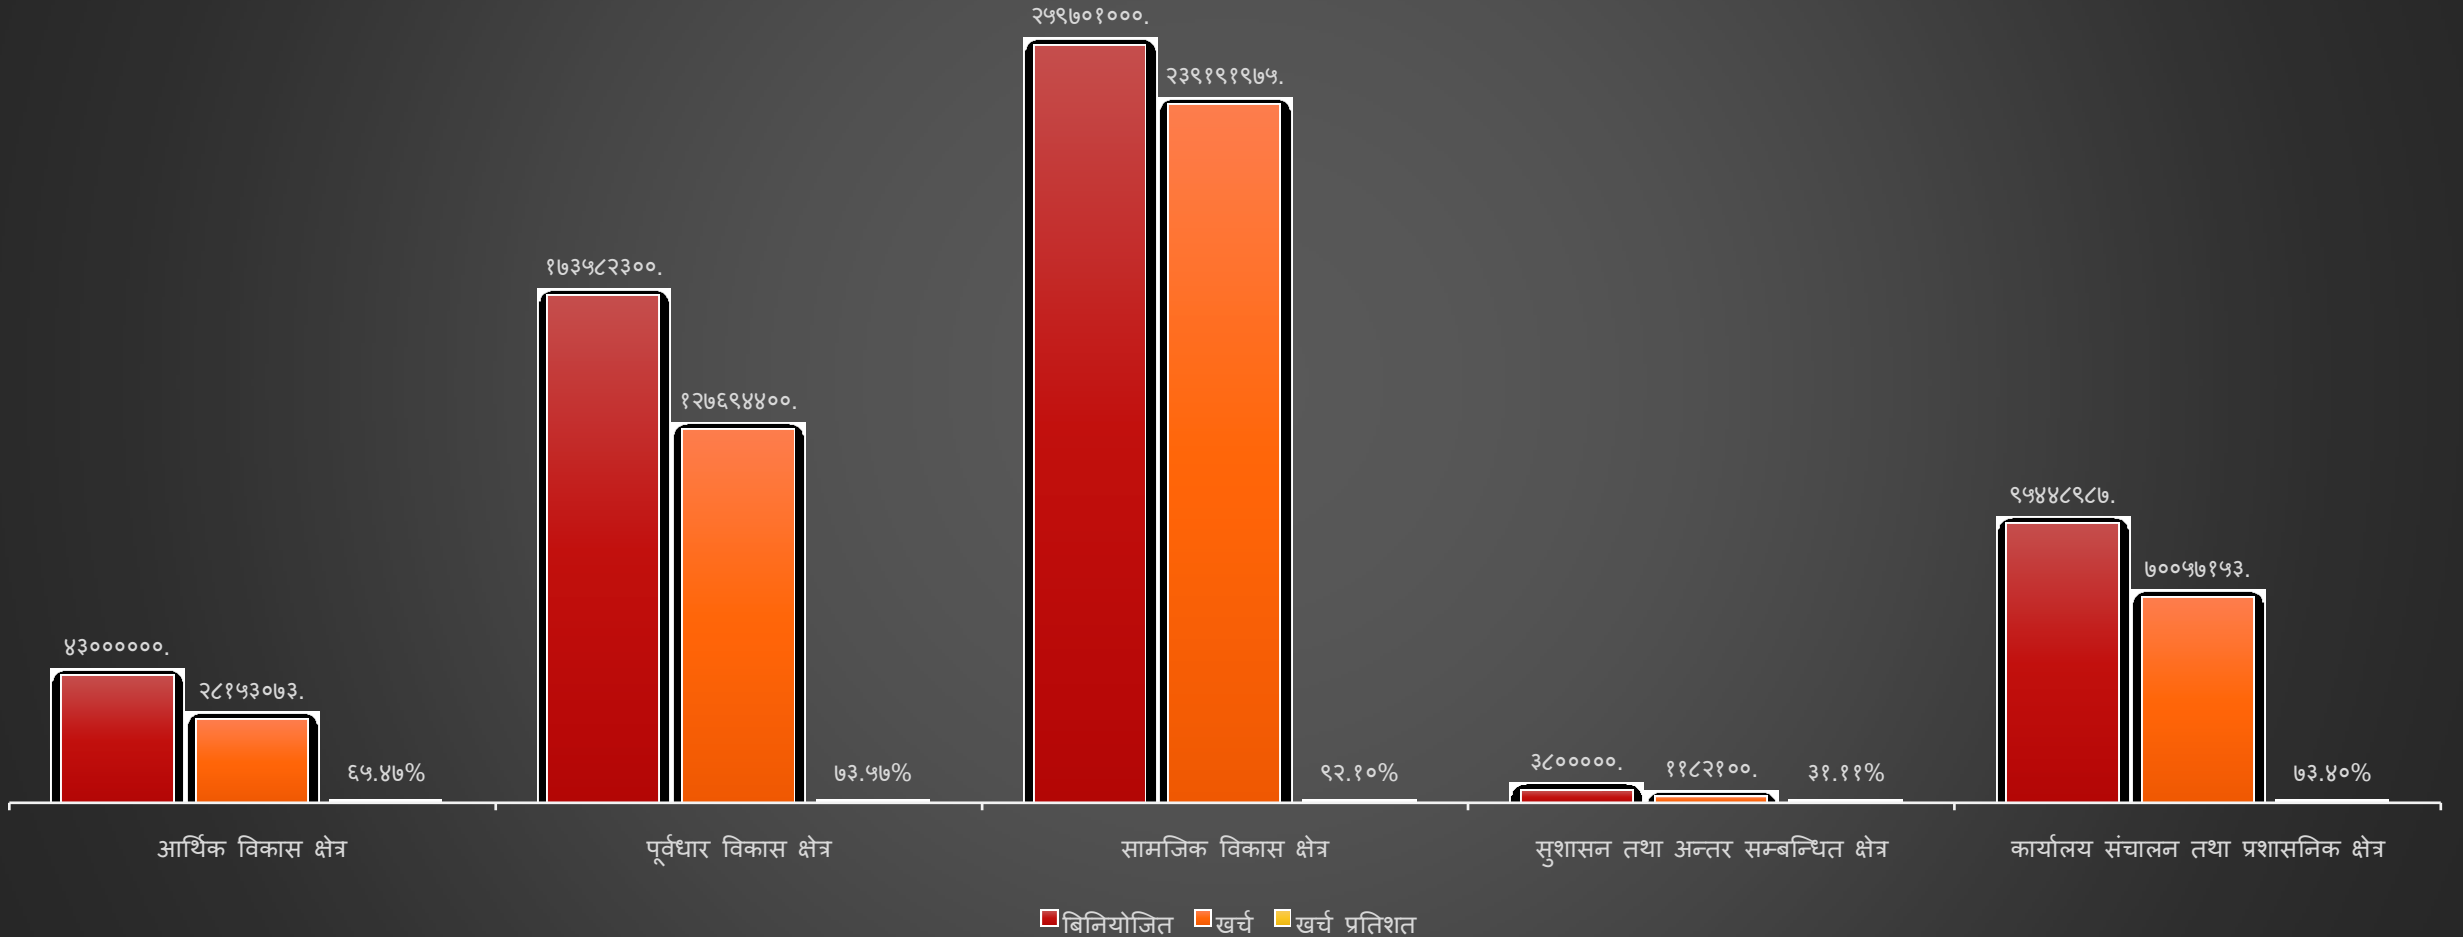


આન્તરિક રાજશવ વિવરણ

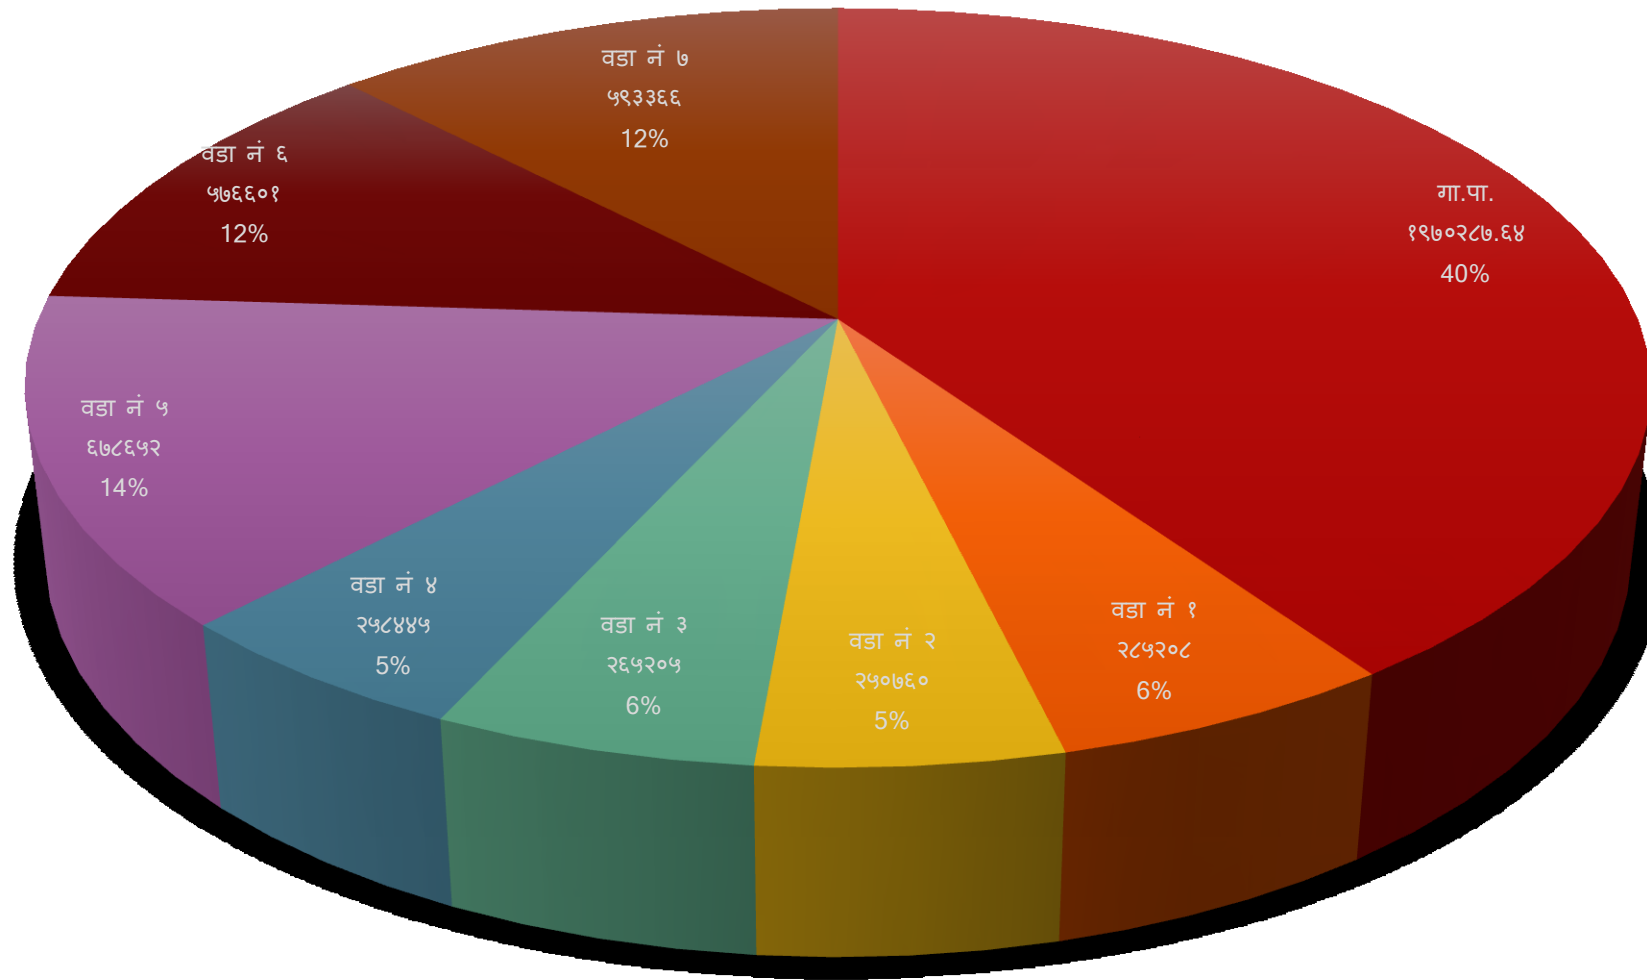




■ ગા.પા. ■ વડા નં ૧ ■ વડા નં ૨ ■ વડા નં ૩ ■ વડા નં ૪ ■ વડા નં ૫ ■ વડા નં ૬ ■ વડા નં ૭

आन्तरिक आयको अवस्था

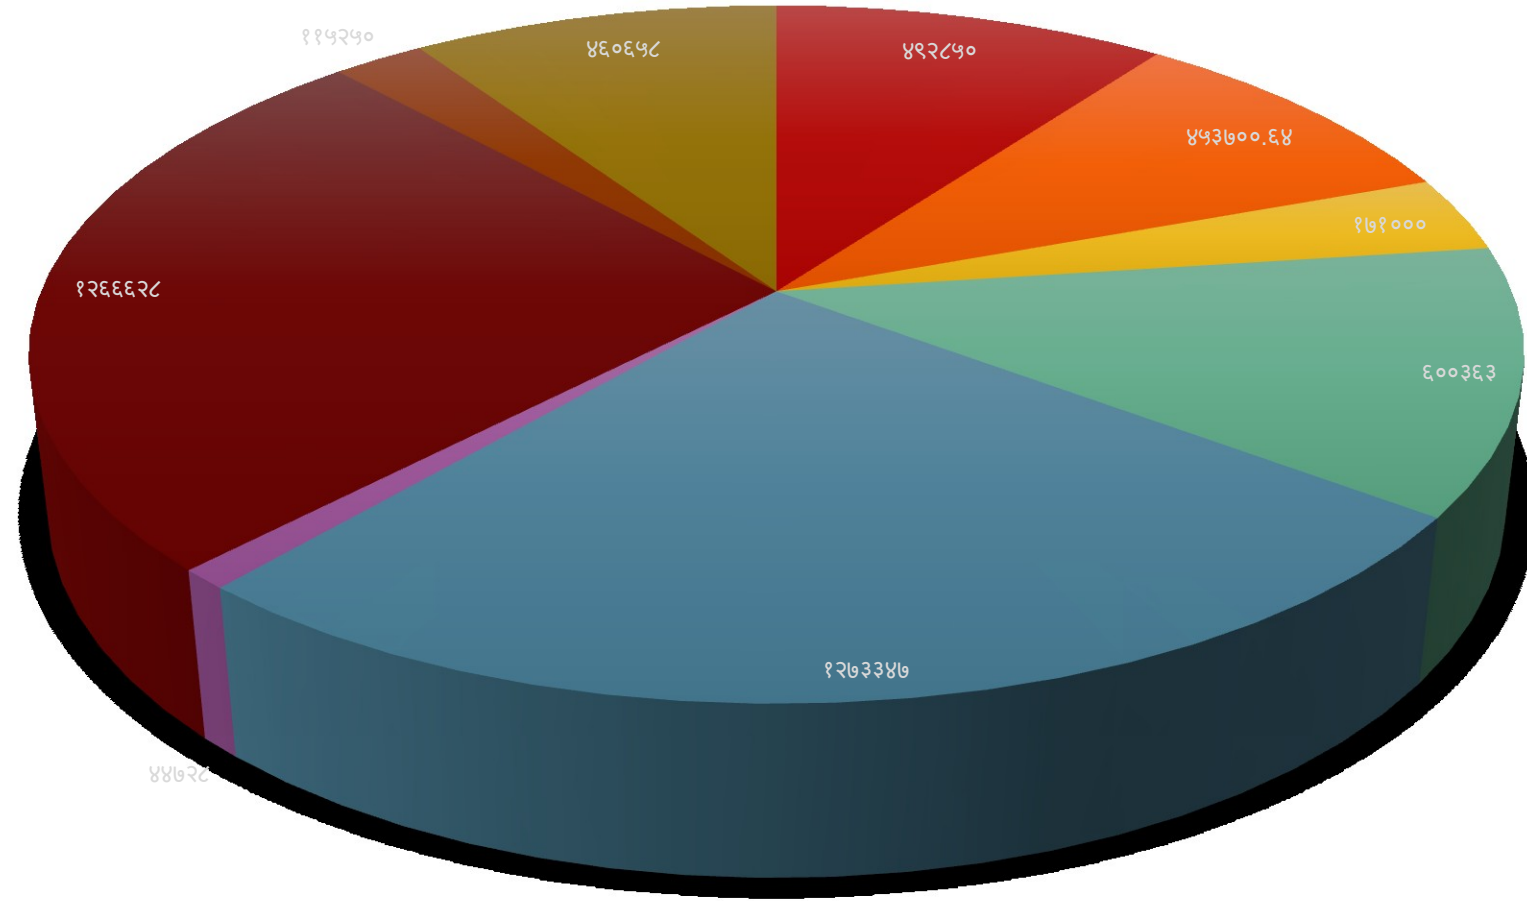


व्यवसाय दर्ता र नविकरण अन्य बैंक जम्मा बोल पत्र शुल्क अन्य सेवा शुल्क मालपोत घर बाहल कर सिफारिस शुल्क योजन सम्झौता व्यक्तिगत घटना दर्ता

Thank You !!!



वार्षिक समिक्षा आ.व. ०७९/८०
गङ्गाजमना गा०पा ०५ वडा
कार्यालय बलौटा



राजकमल राना मगर
वडा सचिव ५

बिकास निर्माण योजना तर्फ : (पुजिगत)

यस गंगाजमुना गाउँपालिकाको आ.व. ०७९-८० को गाउँ सभाबाट यस नं. ५ वडाको लागि विनियोजित रकम रु ८,००,०००।- (अक्षरूपी असी लाख) सडक,खानेपानी विधालय संरचना निर्माण, कृषि,पशु,गोरेटो बाटो निर्माण ,खेल मैदान,कुलो सिचाई, बिपद व्यवस्थापन लगायत सबैमा समेटेर बजेट विनियोजनको मापदण्डमा अधिन्याय रति ०१९ तथा गोर्खापट्टा बजेट गरिएको ।

क्र.सं	योजना तथा कार्यक्रमको नाम	रकम
1	५ नं. वडा भित्रका सडक मर्मत	१२,००,०००।-
2	हिलेपोखरी आ.बि. भवन तथा शौचालय मर्मत	२,००,०००।-
3	सुन्दर आ.बि. स्मार्ट बोर्ड व्यवस्थापन	१,००,०००।-
4	सरस्वती आ.बि. स्मार्ट बोर्ड व्यवस्थापन	१,००,०००।-
5	पल्लो गैरी पंधरो बद्रिचौर सडक स्तरोन्नती	१४,००,०००।-
6	देवीस्थान कल्लेरी सडक स्तरोन्नती	१५,००,०००।-
7	दाते ओखर पकेट क्षेत्र	५,००,०००।-
8	पैयुखर्क खेल मैदान निर्माण	३,००,०००।-
9	लप्सीबोट कान्ले खेत चण्डेनी भुमेस्थान गोरेटो बाटो निर्माण	३,५०,०००।-
10	मन्दारी ढापचौर पहिरो नियन्त्रण	२,००,०००।-
11	मजुवा चर्च घेरावार निर्माण	२,००,०००।-
12	ढाडखर्क चर्च शौचालय निर्माण	१,५०,०००।-
13	महभीर खेल मैदान वाल निर्माण	२,००,०००।-
14	कैचल धारा ठुलो खेत सिचाइ कुलो निर्माण	३,००,०००।-
15	मनपाडखोला घाट व्यवस्थापन निर्माण	३,००,०००।-
16	तल्लो दाडसिङ ठाटी निर्माण	२,००,०००।-
17	बिपद् व्यवस्थापन तथा भैपरी खर्च	८,००,०००।
	जम्मा	

प्रधानमन्त्री कार्यक्रम अन्तर्गत ः

भा त् ०७९२÷१० को लागी प्रधानमन्त्री गेज्जगार कार्यक्रमबाट तिनियोजित रकम रु १० ६५ १०९।-

क०स	योजनाको नाम	विनियोजित रकम	कामदार संख्या
	मजुवा बेशी भङ्केली गोरेटो बाटो निर्माण	१,८०,४९२।-	२६७ जना
	ढाँपाचौर देखि कैचले धारा तेस्रो बाटो ठोत्ने पानी भदौरे गोरेटो बाटो निर्माण	२,५९५८४।-	३८४ जना
	महभीर गोरेटो बाटो निर्माण (महभिर पातल देखि बलरामको खेतसम्म)	१,४९,३९६।	२२१ जना
	जम्मा	५,८९,४७२।-	८७२जना
	मर्मत सम्भार गर्ने योजनाहरु		
	कटुवा चौतारा चारमुरे सिँढी मर्मत	१,६३,५९२।-	२४२ जना
	ढाँडखर्क गंगाजमुना सिँढी मर्मत	१,६९,०००।-	२५०जना
	हटिया डाँडा चौतारो मर्मत तथा पधेरो सम्म महारा खेत देखि गौथली पोखरी सम्म ठाडो बाटो मर्मत	११८,३००।-	१७५जना
	जम्मा	४,५०,८९२।-	६६७ जना कुल 1539 ले काम गरेका छन

कृषि तथा पशुपन्धी

- कृषि सम्बन्धी विषयगत रुपमा बजेट तोकिएर आउनुपर्ने
- जस्तै – कृषि सडक कृषि कुलो कृषि प्रविधिक तथा आधुनिक कृषि यन्त्रिकरण हुनुपर्ने ।
- लम्पी स्किन सम्बन्धी रोगथाम र उपचार प्रयापन नभएको तथा मृत्यु भएका गाई बस्तुहरुको उचित क्षतिपुरती नभएको

दैबिक प्रकोप तथा बाढी पहिरो सम्बन्धमा ।


- मिति २०७९-०२-३१ गते परेको अबिरल वर्षाको कारणले यस वडाको विभिन्न ठाउँमा खानेपानी संरचना, सिचाई, कुलो, खेतियोग्य जमिन क्षति भएको विवरण तपशिल बमोजिम रहेको छ ।
- - पूर्ण क्षति भएका घर - १२ वटा
- - जोखिममा रहेका घर गोठ - १०८
- - पूर्ण क्षति भएका खेत बारी - १० जनाको ६१४ रोपनी जग्गा पूर्ण क्षति भई खेती गर्ने नमिल्ने भएको । २ रोपनी खेतमा लगाएको चैते धान पूर्ण क्षति भएको ।
- - यस वडामा मिति २०७९-०२-३१ गते रातीको अबिरल भारि वर्षातले क्षति भएका जम्मा घरधुरी संख्या १७८ रहेको छ । जस्को व्यवस्थापनको लागि प्राप्त तार जालि ९५ थान र पाल ८४ थान वितरण गरियो
- भैसी ३ मरेको
- - घरको पहिरोले गर्दा ५० मुरी धान कोदो मकै क्षति भएको
- - ११ हजार नगद पुरिएको
- - ८० वटा कुखुरा पुरिएको
- - २ वटा पिसनी कुटनी मिला क्षति भएको
- ५ वटा खानेपानी पूर्ण क्षति ।


वडामा भएका सिर्जनात्मक कार्यहरु

- १. राजश्व संकलनमा बृद्धि
- २. हरेक सिफारिसको लागि निवेदन अनिवार्य
- ३. योजनाहरुको समयमा नै सम्झौता र फरफारक भएको कुनै पनि योजनाहरु फ्रिज नगएको ।
- ४. बिपद् तथा व्यवस्थापन भैपरिको रकम आवश्यकता हेरी योजनामा रकम विनियोजन गरिएको ।
- ५. वडा कार्यालयको दैनिक प्रशासन र अन्य सेवा प्रवाह छिटो छरितो पार्दशिक वनाईएको ।
- ६ हरेक निर्णयहरुमा टोल विकास समितिको संयोजकहरु सरसल्ला र छलफल मार्फत वडा समितिले निर्णय गरि कार्यान्वयनमा ल्याएको ।
- ७. टोल विकास समिति, वन उपभोक्ता समिति, महिला समूह, बिधालयको व्ययवस्थापन समिति, प्र.अ.अन्य सरोकारवालाहरुसंग विभिन्नि मिति र समयमा छलफल तथा भेला गराई सबै पक्षलाई आफ्नो कार्य क्षेत्रमा सक्रिय गराईएको छ ।

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको क्रममा देखिएका समस्याहरू

- १ वडा सचिवलाई अनुगमन कार्यमा खबर पनि नहने र नलैजाने तर अन्तिम भक्तानिको लागि भने वडा सचिवको हस्तक्षर अनिवार्य गरेको हुनाले यस विषयमा छलफल गरनुपर्ने ।

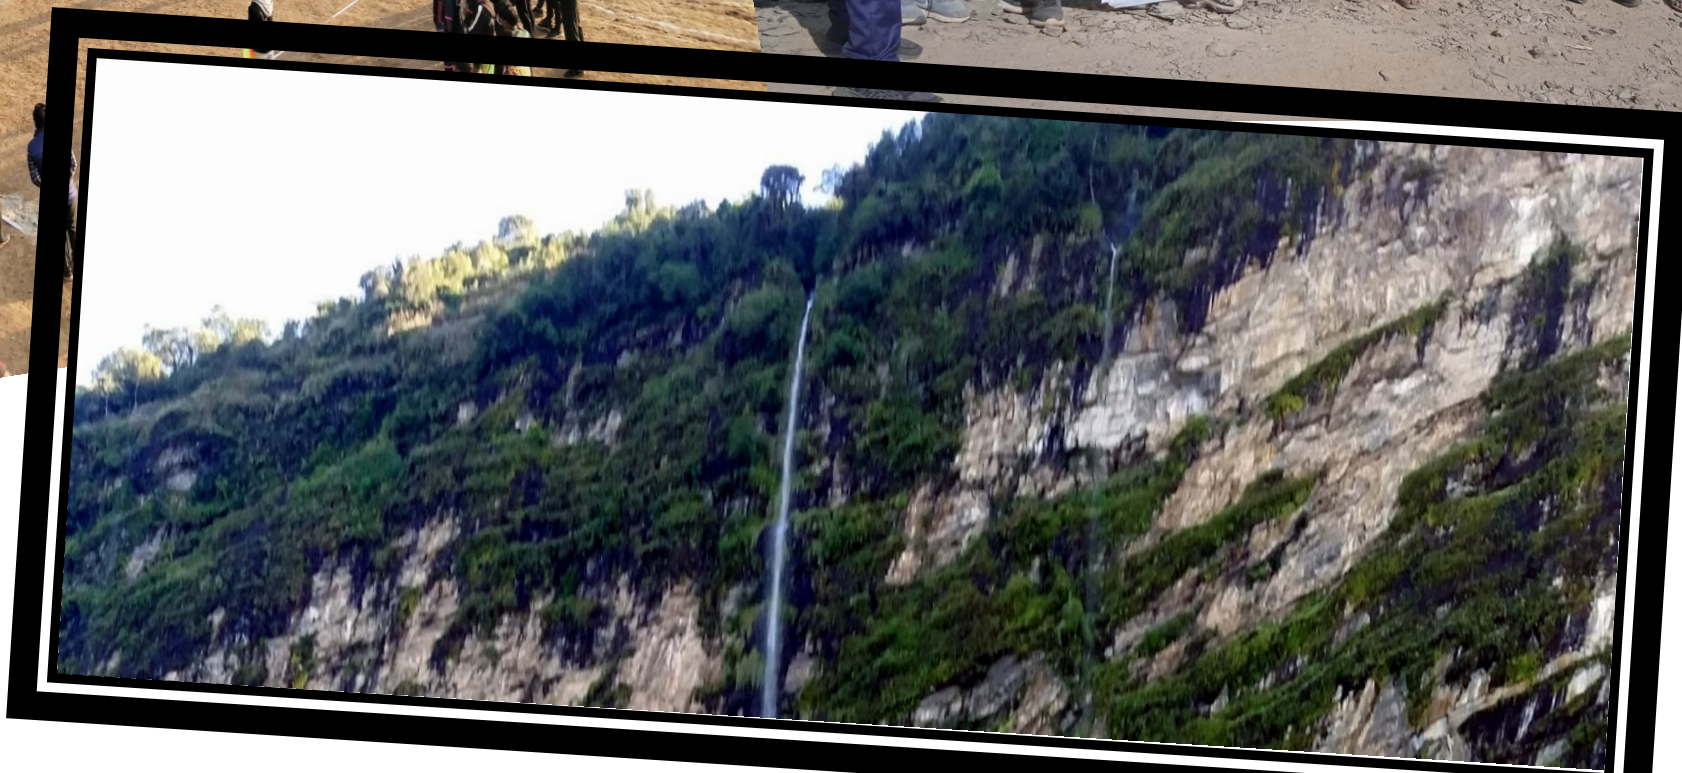



पञ्जीकरण (व्यक्तिगत घटना दर्ता) तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सम्बन्धी वार्षिक समिक्षा

समाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता सेवा इकाई
गंगाजमुना गाउँपालिका,
आ.व २०७९/०८०

क्र सं	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट	खर्च रकम	बाँकी रकम	उपलब्धिहरु	कैफियत
१	सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण	१४,३६,०५,०७६	१४,३५,२४,४३८	८०,६३८	आर्थिक जिविकोपार्जमा सहयोग	
२	व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह	७०,०००	५०,०००	२०,०००	घटना दर्ता सप्ताह वडानं १ देखी ७ सम्म संचालन गरियो	
३	व्यक्तिगत घटना दर्ता					

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको विवरण

Column1	Column2	Column3	Column4	Column5	Column6	Column7	Column8	Column9	Column1	Column2	Column4	Column5
लाभग्राही	पहिलो त्रैमासिक			दोस्रो त्रैमासिक			तेस्रो त्रैमासिक			तेस्रो त्रैमासिक		
	संख्या	विनियोजित बजेट	खर्च रकम	संख्या	विनियोजित बजेट	खर्च रकम	संख्या	विनियोजित बजेट	खर्च रकम	संख्या	विनियोजित बजेट	खर्च रकम
अन्य जेष्ठ नागरिक भत्ता	२३०७	२७०५६३७३.९७	२७००१८१९	२३६८	२८१०१६००	२८०९३६००	२३९९	२८४७६७४२	२८४७३९८४	२४२२	२८८८४७७३	२८८७२१२८
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)	१२८	१०२४१००	१०१६१२०	१२९	१०१८७८०	१०१०८००	१२६	१००५६६३	९९७५००	१२५	१०००१६०	९९२१८०
जेष्ठ नागरिक एकल महिला	२१३	१६८६४४०	१६८६४४०	२१३	१६९४४२०	१६९४४२०	२१७	१७१०८३९	१७१०३८०	२१२	१६८६४४०	१६८६४४०
विधवा	३३८	२६४९३६०	२६४९३६०	३४६	२७१०५४०	२७१०५४०	३४३	२७०७८८०	२७०७८८०	३४९	२७५८४२०	२७५८४२०
पूर्ण अपाङ्गता भत्ता	८३	९७३८२६	९६८२४०	८३	९८५५३०	९८५५३०	८५	९९८१७०	९९८१७०	८५	१००९४७०	१००९४७०
अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता	१५९	९९१६४८	९९१६४८	१६१	१०१७६१०	१०१७६१०	१६५	१०४०६६३	१०४०६६३	१७४	११००१७६	११००१७६
दलित बालबालिका	२००	३१७९९८.७१	३१३२११	२१३	३२७५२७	३२२७३९	२१७	३३२४६६	३२७१४६	२२२	३३७४६०	३३१०७६
जम्मा	३४२८	३४६९९७४६.६८	३४६२६८३८	३५१३	३५८५६००७	३५८३५२३९	३५५२	३६२७२४२३	३६२५५७२३	३५८९	३६७७६८९९	३६७४९८९०

व्यक्तिगत घटना दर्ता वडा नं१







व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह वडा नं४



व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह वडा नं५



व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह वडा नं६



व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह वडा नं७



व्यक्तिगत घटना दर्ता

जिल्ला : धादिङ गा.पा: गङ्गाजमुना दर्ता मिति देखि : २०७९-०४-०१ दर्ता मिति
सम्म : २०८०-०३-३१


वडा नं.	सम्बन्ध बिच्छेद							विवाह	बसाई सरी आएको		बसाई सरी जाने		जम्मा
	जन्म			मृत्यु					दर्ता संख्या	सदस्यको संख्या	दर्ता संख्या	सदस्यको संख्या	
	पुरुष	महिला	जम्मा	पुरुष	महिला	जम्मा	जम्मा	जम्मा					
१	१००	१३०	२३०	३६	३८	७४	४	५१			१३	५७	३७२
२	९९	१२१	२२०	२६	४४	७०	११	१००	१	१	१५	४२	४१७
३	४५	४७	९२	२१	१९	४०	१२	७३	२	५	९	३०	२२८
४	४८	५०	९८	२०	३०	५०	५	६५	२	५	११	२९	२३१
५	१०३	९५	१९८	४०	५६	९६	९	९८			१७	६८	४१८
६	१०८	१०५	२१३	२९	३८	६७	१२	१०६	२	५	१४	४२	४१४
७	४९	५७	१०६	३१	४०	७१	११	८२			२६	९५	२९६
जम्मा	५५२	६०५	११५७	२०३	२६५	४६८	६४	५७५	७	१६	१०५	३६३	२३७६

वार्षिक प्रतिवेदन २०७९/०८०

ई. जिवन कुमार श्रेष्ठ
भौतिक तथा पूर्वधार विकास शाखा
गंगाजमुना गाउँपालिका, फूलखर्क धादिङ


योजना तथा कार्यक्रमहरु

जम्मा योजना सङ्ख्या १९७

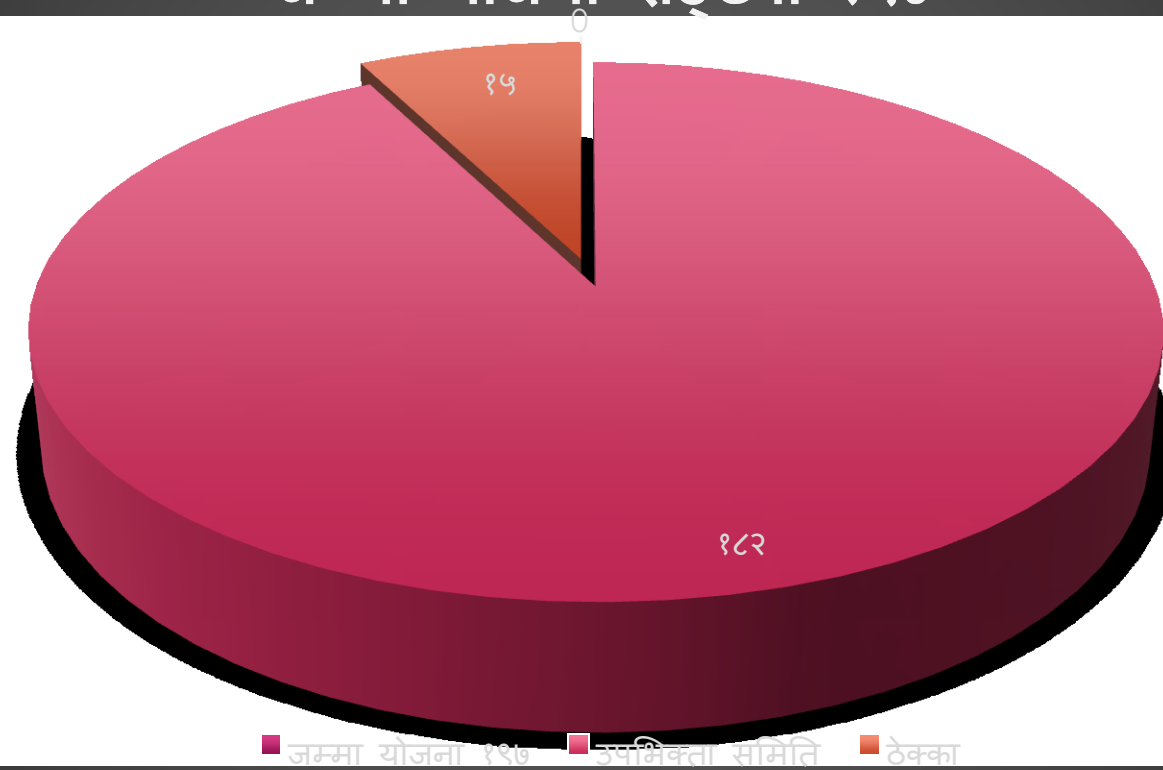

योजना तथा बजेट खर्च बिबरण

बिनीयोजित रकम १४४१५३०००

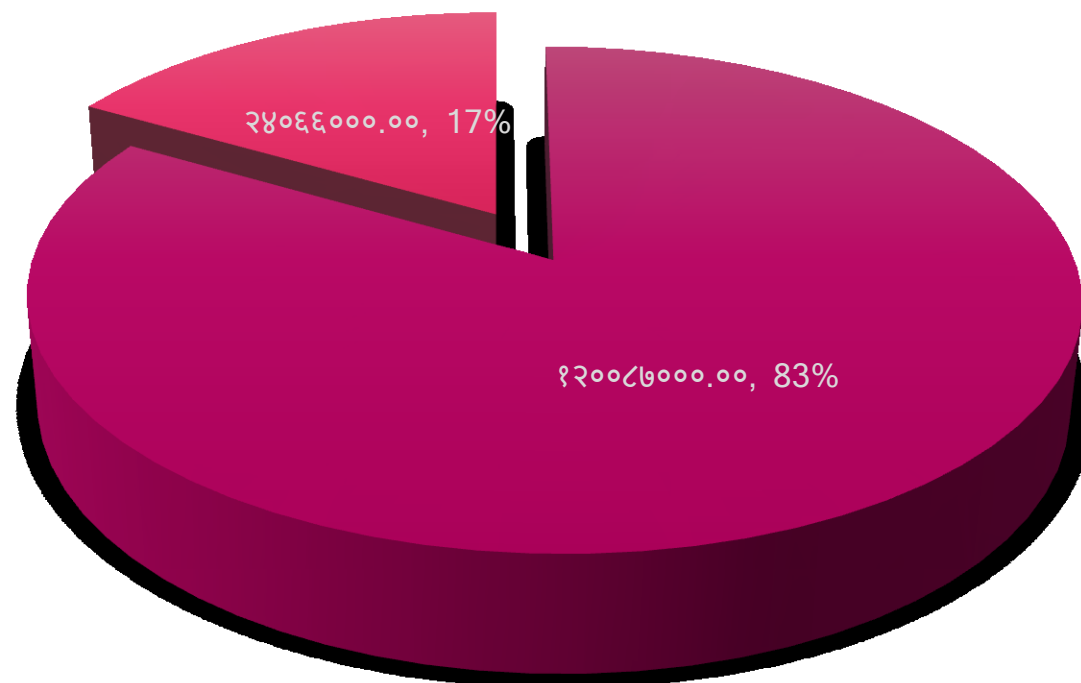

■ खर्च रकम ■ बाकि रकम

मुख्य आयोजनाहरू

SN	Main Project name	Agreement amount	Final Bill	Remarks	Progress in %
1	chimchok pokhara gumdi puchar chelang simkhada tol khanepani	2940869.61	2796889.22	Samiti	95%
2	chimchok dekhi latap sadak	4154198	4116459	Thekka	99%
3	mahalaxmi sallaghari sadak	3699662	3088377	Thekka	83%
4	mahare malla tole khanepani	2905033.1	2894843.47	Samiti	100%
5	honkong khola truss bridge	1511857.34		Thekka	0%
6	bhaja phalange satdobato sadak	7927864.46	6960704	Thekka	88%
7	bardan swasthe chauke	8792613.36	6503725	Thekka	74%
8	brihat baseri khanepani	5956949.13	5880506.86	Thekka	99%
9	bhrit budathum khanepani	6158610.19	5926376.17	Thekka	96%
10	gumdi chelang chimchok sadak	13645645	13444806	Thekka	99%
11	tinkhanva maiyuwa dadagaun bhaice sadk	8976526	8777054	Thekka	98%

सकारात्मक प्रभावहरु:

- ▶ आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा यस पालिकामा कुल ९९४ घरधुरीमा व्यवस्थित तथा सुद्ध खानेपानी प्रणालिको पहुँच पुगेको छ ।
- ▶ यस गङ्गाजमुना गाउँपालिकाको सम्पूर्ण वडाहरुमा वर्षाको समयमा एक दुई दिन बाहेक बाह्रै महिना यातायातको निरन्तर संचालन भएको छ ।
- ▶ गाउँ पालिकाको सातै वटा वाड कार्यलयहरु निर्माण भई कार्यलय संचालनमा सहज भएको छ ।

असल अभ्यासहरू

- ▶ आयोजना कार्यनयनको क्रममा देखिएका समस्या तथा चुनौतीहरू को समधान गर्न र निर्माण कार्य चुस्त दुरुस्त गतिमा सम्पन्न गराउन निर्माण व्यवसायीहरूलाई दवाव दिन मासिक रुपमा पालिकाको बैठक हलमा उपस्थित गराई छलफल कार्यक्रम गरियो ।
- ▶ राम्रो काम गर्ने उपभोक्ता समितिहरूलाई सातै वडा बाट उत्कृष्ट समिति छनौट गरि पुरस्कृत गरियो ।
- ▶ पहिरो तथा आगलागि जस्ता विपद्हरूको कारण क्षति पुगेका घरको स्थलगत अनुगमन र पहिलो पटक सभै (NDRRMA mobile app) मार्फत गरि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा पठाइयोयेक ।
- ▶ पालिकाका सम्पुण वडामा योजाना संम्बन्धित समितिलाई यसै वर्षबाट अभिमुखिकरण कार्यक्रम संचालन गरिएको छ ।

कार्यनयनको क्रममा देखिएको समस्या तथा चुनौतीहरू

- ▶ राम्रो अवस्थामा रहेको जे.सि.वि उपलब्ध नभएको कारण उपभोक्ता समितिले आयोजनामा तोकिएको समय र बजेट भित्र रहेर काम सम्पन्न गर्न चुनौती देखिएको छ ।
- ▶ मुख्य निर्माण व्यवसायी उपस्थित नभई पेटीमा काम गर्ने प्रविदिका कारण फिल्डमा जिम्मेवारी कम भएको देखिन्छ जस कारण सामन र जनसक्ती समयमै उपलब्ध नभई ढिला सुस्ति भएको देखिन्छ ।
- ▶ निर्माण व्यवसायीहरूले ठेक्कामा भएको अण्ठ्यारो/गारो कामहरू छोडेर सजिलो काम मात्र पहिले गर्ने चलन रहेको कारण आयोजनाको अति आवश्यक काम पनि छोडेको देखिन्छ ।
- ▶ रनिङ बिलको भुक्तानी लिएर निर्माण व्यवसायी धेरै समय सम्म फिल्डमा उपस्थित नभएको कारण साइटमा काम ठप्प हुने गरेको देखिन्छ । यसले गर्दा ठेक्का समयमा नै सम्पन्न नभएको कारण म्याद थप गर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ ।

कार्यनयनको क्रममा देखिएको समस्या तथा चुनौतीहरू

- ▶ दक्ष जनशक्तीको अभावको कारण प्रायजसो सबै योजनाहरूमा काम गुणस्तरको गराउन चुनौती देखिन्छ ।
- ▶ उपभोक्ता समितिले बिधान अनुसारको काम कर्तव्य र अधिकारको कार्यनयन गर्न नसकेको देखिन्छ ।
- ▶ कुनै योजना सम्झौता नै नगरि निर्माण कार्य सुचारू भएको देखिन्छ । त्यस योजनामा लागत अनुमान अनुसार काम गराउन चुनौती देखिन्छ ।

सुझावहरू

- ▶ उपभिक्षा समितिका पदाधिकारी र जन प्रतिनिधि सँगै योजनाको गुणस्तरिय कार्यको लागि प्राविधिक तथा प्रशासनिक कर्मचारी सहितको अन्तर्क्रिया कार्यक्रम तथा अभिमुखिकरण तालिम आयोजना गर्ने ।
- ▶ कुनै योजनामा समस्या आएमा जनप्रतिनिधि र सम्बन्धित शाखाको कर्मचारी बस्ने त्यस प्रश्नात समिति वा निर्माण व्यवसायि सँग समस्याको बारेमा छलफल गर्ने ।
- ▶ मुख्य काम जस्तै **RCC** ढलानमा सम्बन्धित कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको अनिवार्य उपस्थिति हुनुपर्ने ।
- ▶ निर्माण व्यवसायीहरूले सजिलो काम पहिले गरेर गाह्रो काम छोड्ने प्रविधि देखिएकोले रनिङ बिल निश्कासन गर्दा ठेक्कामा रहेको **BOQ** को सबै **Item** समान रुपमा सम्पन्न भईरहेको हुनुपर्ने ।
- ▶ जग्गा रेखाङ्कन गर्ने क्रममा जनप्रतिनिधिहरूको उपस्थिति भएमा सहज हुने देखिन्छ ।

सुझावहरू

खानेपानी:

- ▶ खानेपानीको उपभोक्ता समितिको दिगोपनाको लागि निरन्तर समितिको मासिक बैठक बसि योजनाको विश्लेषण गरि मर्मत संम्भार गर्ने ।
- ▶ मर्मत संम्भार कोषको व्यवस्थापन गर्ने ।
- ▶ मर्मत संम्भार कार्यकर्ता (VMW Trainning गरेको) नियुक्ति गर्ने ।
- ▶ सकेसम्म खानेपानी उपभोक्ता समिति गठन गर्दा स्थायि रुपमा गाउँमै बसोबास गर्ने व्यक्ति राख्ने ।

योजनाका फोटो तथा भिडियोहरु



गुरुङगाउँ अंबोटे गोरेटो बाटो
गंगाजमुना-३

योजनाका फोटो तथा भिडियोहरु



आर.भि.टि



ईन्टेक (सि.सि + भल्ब चयाम्बर)



आर.भि.टि बनाउँदै

खानेपानि योजानाका तास्बिरहरु

योजनाका फोटो तथा भिडियोहरु



आर.सि.सि ढलान कार्य

योजनाका फोटो तथा भिडियोहरु



खानेपानि योजनाको मापन गरिदै

योजनाका फोटो तथा भिडियोहरु



ग्याबिन जालि नाप्टै



डरई वाल



ढुङ्गा सोलिड

योजनाका फोटो तथा भिडियोहरु




सल्याब ढलान



ढङ्गे धारा



सोलिङ



धन्यवाद

महिला बालबालिका तथा
ज्येष्ठ नागरिक शाखा बार्षिक
प्रतिवेदन आ.व. ०७९/८०

क्र. स.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित रकम	खर्च रकम	उपलब्धिहरु
१	अपाङ्ग परिचय पत्र वितरण समन्वय समिति बैठक सञ्चालन खर्च	१,००,०००	९१,०००	समन्वय समितिको बैठकबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई परिचय पत्र वितरण गरिएको छ । क-१७, ख-३८ -ग-१५ र घ को ७ गरि जम्मा ७५ जनालाई वितरण गरिएको ।
२.	अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि सहायक सामग्री वितरण कार्यक्रम	६,००,०००	४,७३,०००	अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरुलाई सहायक सामग्री खरिद तथा वितरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
३.	उपाध्यक्ष उद्यमशिलता महिलाहरुको लागि सिलाई बुनाई तालिम	७,००,०००	०	
४.	दिवसिय कार्यक्रम सञ्चालन खर्च (नारी दिवस, तीज कार्यक्रम)	२,००,०००	१,९८,०००	पालिका स्तरिय तीज गीत प्रतियोगिता र वक्तृत्वकला प्रतियोगिता तथा विवध कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।
५.	उपाध्यक्ष उद्यमशिलता महिला कार्यक्रम (व्यूटीपार्लर तथा नाई सम्बन्धि तालिम)	५,००,०००	०	
६.	दलित महिला, अपाङ्ग तथा लक्षित वर्ग क्षमता विकास कार्यक्रम १६ दिने लैंगिक हिंसा विरुद्ध कार्यक्रम	१,००,०००	१,००,०००	लैंगिक हिंसा विरुद्ध १६ दिने सचेतनामुलक अभिमुखिकरण तथा अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको ।
७.	ज्येष्ठ नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य परिक्षण कार्यक्रम ७ वटै वडामा	५,००,०००	०	
८.	ज्येष्ठ नागरिक तथा शहिद परिवार सम्मान कार्यक्रम	५,००,०००	०	
९.	४० वर्ष पुगेका एकल महिला संरक्षण कार्यक्रम	६,००,०००	५,५१,०००	४० वर्ष पुगेका अविवाहित एकल महिला संरक्षण कार्यक्रम ४६ जनालाई मासिक रु १००० का दरले भत्ता वितरण गरिएको छ ।
१०	स्थानीय तहमा बालमैत्री स्थानीय	२,००,०००	२,००,०००	बालमैत्री स्थानीय तह घोषणाको लागि अभिमुखिकरण कार्यक्रम तथा

प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित योजना तथा कार्यक्रम

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित रकम	खर्च रकम	उपलब्धिहरू
१	अपाङ्ग भएका व्यक्तिका लागि समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना सहयोग कार्यक्रम	३,००,०००	३,००,०००	अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूको लागि समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना सहयोग कार्यक्रम (सि.बि.आर) २०७९/१०/२८ र २९ गते २४ जना अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूलाई २ दिने बारब्रा पालन तालिम र बारब्रा वितरण कार्यक्रम समापन गरिएको ।
२	बालमैत्री स्थानीय तह घोषणा कार्यक्रम	१,५०,०००	१,५०,०००	बालमैत्री स्थानीय तह घोषणाको लागि अभिमुखिकरण कार्यक्रम तथा पालिका स्तरीय बाल सञ्जाल गठन हुँदै वडा नं. ३,४ र ६ मा बाल सञ्जाल समिति गठन र वडा समिति गठन हुनुको साथै वडा स्तरीय बाल क्लब गठन भएको छ र मा.बि.स्कूलहरूको किशोरकिशोरिहरूलाई बालविवाह सम्बन्धि सचेतनामुलक कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
३	बाल विवाह अन्त्यका लागि समुदाय परिचालन कार्यक्रम	१,५०,०००	१,५०,०००	मा.बि.स्कूलहरूको किशोरकिशोरिहरूलाई बालविवाह सम्बन्धि सचेतनामुलक कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
४	आमाबाबु विहिन बालबालिका संरक्षण कार्यक्रम	६,००,०००	४,३८,०००	आमा, बाबु विहिन बालबालिका संरक्षण कार्यक्रम १७ जनालाई मासिक रु.२००० का दरले भत्ता वितरण गरिएको छ ।

वार्षिक कार्ययोजना
गंगाजमुना गा.पा. वडा नं.-३
वडा कार्यालय गुम्दी
प्रगति प्रतिवेदन आ.व. २०७९/०८०

निर्मला चौधरी
वडा सचिव
गंगाजमुना गाउँपालिका वडा नं.-३

❖ घटनादत्ता (आ.व.२०७९/०८०)

क्र. स.	शिर्षक	महिला	पुरुष	जम्मा	जम्मा
१.	जन्म दत्ता	५२	५२	१०४	
२.	मृत्यु दत्ता	३८	५१	८९	
३.	बिवाह दत्ता	९३			
४.	बसाईसराई दत्ता	१९	२१	२०	
५.	सम्बन्ध विच्छेद दत्ता	६			

❖ राजस्व

क्र.स.	शिर्षक	रकम	कैफियत
१.	नगदी रसिद	रु. १,९०,४५३	
२	मालपोत रसिद	रु. ७४,७४८	
जम्मा		रु. २,६५,२०१	

❖ योजना तथा कार्यक्रम (२०७९/०८०)

क्र.स.	योजना तथा कार्यक्रम	विनियोजित रकम रु.	कैफियत
१	वडा नं. ३ भित्रका सडक मर्मत	रु. ८,००,०००	
२	ठकुरी डाँडा चनौटे दुवालाखोला गुम्दी सडक स्तरोन्नती	रु. ८,००,०००	
३	छेलाङ गोरेटो बाटो ढल निकास मानेडाँडा रेलीङ निर्माण	रु. ५,००,०००	
४	३ नं. वडा कार्यालय प्रतिक्शालय निर्माण	रु. ५,००,०००	
५	पोखरा चिम्चोक सडक स्तरोन्नती	रु. ३,००,०००	
६	चिम्चोक सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई व्यवस्थापन	रु. १,००,०००	
७	वडा नं. ३ सरसफाई कार्यक्रम साझेदारी	रु. २,००,०००	
८	चिम्चोक सामुदायिक भवन मर्मत तथा बस्ति संरक्षण	रु. ३,००,०००	

...ક્રમશઃ

ક્ર.સ.	યોજના તથા કાર્યક્રમ	વિનિયોજિત રકમ રૂ.	કૈફિયત
૯	છેલાડ સામુદાયિક ભવન મર્મત	રૂ. ૨,૦૦,૦૦૦	
૧૦	ચિમ્ચોક મમ્મૈ આરુખેત સ્લ્યાબ પુલ મર્મત	રૂ. ૩,૦૦,૦૦૦	
૧૧	સુનૌલા સામુદાયિક ભવન ઘેરાબાર	રૂ. ૨,૦૦,૦૦૦	
૧૨	પોખરા આલુ ભણ્ડાર વ્યવસ્થાપન તથા માટો પરિક્ષણ	રૂ. ૪,૦૦,૦૦૦	
૧૩	આરુખેત સિંચાઈ મર્મત	રૂ. ૩,૦૦,૦૦૦	
૧૪	કલ્યાણ આ.વિ. વ્યવસ્થાપન	રૂ. ૨,૦૦,૦૦૦	
૧૫	વાલ કલ્યાણ આ.વિ. વ્યવસ્થાપન	રૂ. ૧,૦૦,૦૦૦	
૧૬	કલ્યાણ આ.વિ. છેલાડ વ્યવસ્થાપન	રૂ. ૧,૦૦,૦૦૦	
૧૭	વિપદ વ્યવસ્થાપન તથા ભૈપરી ખર્ચ	રૂ. ૭,૦૦,૦૦૦	
	જમ્મા	રૂ. ૬૦,૦૦,૦૦૦	

❖ प्रधानमन्त्री कार्यक्रम अन्तर्गतबाट विनियोजन भएका योजनाहरु:-

क्र. स.	योजनाहरु	रकम रु.	कैफियत
१	आरुखेत, बर्दान, छेलाङ, मम्मै गोरेटो बाटो निर्माण	रु. ४,५३,७२४.४४	
२	चिम्चोक, पोखरा, भिरकुना, गुम्दी र सिम्जाङ गोरेटो बाटो निर्माण	रु. ३,४७,२७०.६६	
	जम्मा	रु. ८,००,९९५.१	

❖ वडा कार्यालयमा भए गरिएका कार्यहरु:

- ▶ योजनाहरु बेलायमा सम्झौता गरि कार्य गरेका
- ▶ वडामा बिनियोजन भएका कुनै पनि योजनाहरु फ्रिज नगएको
- ▶ विपद व्यवस्थापन भैपरी शिर्षकमा छुटाईएको रकम आवस्यकता अनुसार कार्य गरिएको
- ▶ हरेक शिर्षकको राजस्व संकलन गरिएको
- ▶ कार्यालयको दैनिक प्रशासन तथा अन्य सेवासुविधामा सहज र पारदर्शिता गराईएको

❖ अनुगमनका केहि तस्बिरहरु:



धन्यवाद !

स्वागतम्

मिति: २०८०/०५/२१ गते

**आ.व. २०७९/८० वार्षिक समिक्षा कार्यक्रम
गंगाजमुना गाउँपालिका वडा नं ६ को कार्यालय
बसेरी, धादिङ**



१. कार्यान्वयन भएको योजना तथा कार्यक्रमहरु, विनियोजित बजेट रकम र भएका खर्च रकमहरु

क्र.स	योजनाको नाम	विनियोजित रकम रु.	लागत अनुमान रकम रु.	मुल्याङ्कन रकम रु.	गा.पा बाट स्विकृत रकम रु.	खर्च प्रतिशत
१	वडा नं.६ भित्रका सडक सरसफाई तथा मर्मत	१००००००	1,181,166.39	1,176,463.72	९९५०००	९९.५%
२	पाल्ते चिसापानी खा.पा मर्मत	३०००००	352989.99	340,098.56	२८७०००	९५.६७%
३	आरुबोटे भंगेरि खा.पा एक घर एक धारा निर्माण	७०००००	823471.46	-	६९७०००	९९.५७%
४	छाप खा.पा ट्याङ्कि निर्माण	२०००००	237,319.75	233498.25	१९६०००	९८%
५	बुढिखोला खा.पा ईन्टेक निर्माण	१०००००	117,174.86	114,568.91	९७०००	९७%
६	खिरबोटे सामुदायिक भवन निर्माण	५०००००	586,910.72	584345.42	४९७०००	९९.४%
७	नमुना टोल दलित सामुदायिक भवन निर्माण	२०००००	241,110.49	237878.84	१९६०००	९८.२५%

८	अन्नपुर्ण आ.बि ब्यबस्थापन	२५००००	295,716.25	293,775.63	२४८०००	९९.२०%
९	आरुबोटे आ.बि ब्यबस्थापन	१५००००	177,394.67	175,112.17	१४७०००	९८.३३%
१०	भैसे आ.बि ब्यबस्थापन	१५००००	178,893.15	181,335.83	१५००००	१००%
११	बगैचा देखि परिवारटोल मोटर बाटो निर्माण	२०००००	241,871.99	239,802.28	१९८०००	९९%
१२	टेकबहादुर परियार घर अगाडि मेसिनरि वाल निर्माण	२०००००	240,347.50	243,281.88	२०००००	१००%
१३	गंगटे बाख्रेखोला आडटारि सानीखोला कृषि सडक	३०००००	354,265.51	351,204.97	२९६०००	९८.८३%
१४	बिधुत कर्मचारि ब्यबस्थापन	३५००००	-	-	३५००००	१००%

१५	राईगाँऊ पैयुखर्क हिउँदे सिँचाई कुलो निर्माण	२००००००	234,698.23	-	१९७०००	९८.५%
१६	तल्लो बि.क टोल भुतखोला पुल निर्माण	४०००००	481,508.47	479371.98	३९७०००	९९.३८%
१७	भैसे लिसोङ् र ब्यारासोङ् खोला ढलान पुल निर्माण	४०००००	473,415.29	471,126.80	३९७०००	९९.३८%
१८	हिस्से खोला ढलान पुल निर्माण	१५००००	180,479.81	178,083.11	१४७०००	९८.३३%
१९	अधेरी आँपखोला ढलान पुल निर्माण	२०००००	242,121.54	240300.29	१९८०००	९९.०८%
२०	भैसे बौद्ध गुम्बा मैदान निर्माण	१५००००	177,466.50	180,967.81	१५००००	१००%
२१	बनबोटे घोटडाँडा पिप्ले गोरेटो बाटो निर्माण	२०००००	233,790.90	235,218.90	१९८०००	९९.२५%

२२	डाँडागाऊ कोलडाँडा मानेश्वारा महरे बन्दिश्वारा आरुबोटे मरनघाट गोरेटोबाटो निर्माण	५५००००	633,429.20	630,800.40	५४७०००	९९.४५%
२३	बिपद ब्यबस्थापन तथा भैपरि	१००००००	-	-	-	-
२४	बिपद ब्यबस्थापन तथा भैपरि	१०००००	-	-	९८०००	९८%
२५	बिपद ब्यबस्थापन तथा भैपरि	१०००००	-	-	१०००००	१००%
२६	वडा स्तरिय महिला भवन ब्यबस्थापन	३०००००	-	-	३०००००	१००%
२७	खानेपानी तथा ग्याबिन जाली खरिद	५०००००	-	-	४९९०००	९९.८%
२८	आहालडाँडा अँधेरिखोला हे.पो सडक स्तरउन्नति	४०००००	472,159.88	469,423.96		

देउरालि बाँसपानी सडक निर्माण (१५००००)र बिऊ बैंक (२५००००) गरि आहालडाँडा अँधेरिखोला हे.पो सडक स्तरउन्नति बनाई काम गरेको

क्र.स	योजनाको नाम	बिनियोजित रकम रु.	लागत अनुमान रकम रु.	मुल्याङ्कन रकम रु.	गा.पा बाट स्विकृत रकम रु.
१	कृषि सडक (७ वडा)	१५००००	179,063.66	181,118.42	
२	भंगेरि देविस्थान मन्दिर निर्माण	३०००००	359,749.07	356823.23	
३	भैसे पाहुना घर पुर्वाधार बिकास	४०००००	471,054.67	-	
४	भैसे पाहुना घर पुर्वाधार बिकास	५०००००-	621,975.23	623,100.23	
५	आहालडाँडा अँधेरिखोला हे.पो सडक स्तरउन्नति	२०५००००	2,413,010.26	2,397,307.18	

* अन्य

* संघ समपुरक

* बुढाथुम बेशि ओडारे पिप्ले हटिया माहलक्ष्मी सडक स्तर उन्नति-१३६०००००

* तिनखण्डे मजुवा डाँडागाँऊ भैसे सडक स्तरउन्नती-

* प्रदेशका योजनाहरु

* माहालक्ष्मी सल्लेघारी राधाकृष्ण मन्दिर - ५००००००

* लक्ष्मी सल्लेघारी पहिराधारा सडक -२००००००

* वडारे घोटडाँडा पिप्ले लापुडाँडा मान्बु सडक -२००००००

* चिप्लेटि बि.क टोल सडक -२००००००

* महरे मल्ल टोल खा.पा -२५०००००

* मंसिरे खेल मैदान -१००००००

* बृहत बसेरी खा.पा -७५०००००

२. योजना तथा कार्यक्रमको कार्वान्वयन पस्चात भएका उपलब्धि तथा सकारात्मक प्रभावहरु ।

गंगाजमुना गाउँपालिका बसेरी ६ को कार्य विवरण

क्र.स	विवरण	एकाई	परिमाण
१	एक घर एक धारा	ओटा	२३२
२	सुक्खा सोलिंग	मि	६१९
३	बिम सोलिंग	मि	590
४	साना खोल्सी पुल	ओटा	६
५	गोरेटो बाटो सोलिंग	मि	१७५
६	गोरेटो बाटो निर्माण	मि	१६०६
७	RVT टंकी (६ ओटा)(२०,२०,२०,१०,१०)	घ मि	८०
८	HUME PIPE(25 nos)	मि	६२.५
९	PLUMB CONCRET	घ मि	१५५
१०	STONE MESSIONERY WALL	घ मि	१७१.५

११	GABION 1.5X1X1=209,209*1.5=313.5 2x1X1=254,254*2=508	घ मि	821.5
१२	सडक ढलान	मि	२१६
१३	सिंचाई पाईप	मि	५४६
१४	मन्दिर	ओटा	१
१५	पाहुना घर		निर्माणको चरणमा रहेको
१६	फोहोर व्यावस्थापन च्याम्बर	ओटा	२
१७	खानेपानी पाईप	मिटर	२०१००

- * सडक निर्माणले सवारी साधन सहजरूपमा संचालन भएको ।
- * एक घर एक धारा खानेपानी सम्पन्न भएको टोलमा शुद्ध खानेपानी प्रयोग गर्न पाएको, पानीजन्य रोग लाग्नबाट सुरक्षित भएको ।
- * गोरेटो, घोरेटो बाटो निर्माणले आवत जावतमा सहज भएको ।
- * सिंचाई कुलो निर्माणले खेति पाति गर्न सहज भएको ।
- * स-साना खोला नालामा बनेका पुल पुलेसाले वर्षाको समयमा हुने दुर्घटना न्युनिकरण भएको ।
- * फोहोर ब्यबस्थापन च्याम्बर बन्नाले दैनिक जिवनमा उत्पादन हुने फोहोरबाट हुने बाटो वरिपरि, खोला खोल्सा फोहोर रहित भएको । (भैसे गाँउ)

भैसे पुल



बुढि खोला मेसिनरि वाल





३. शाखागत वा वडागत रुपमा गरिएका सिर्जनात्मक कार्यहरु असल अभ्यासहरु तथा अन्य महत्वपूर्ण कार्यहरु

- * डेन्गु रोग नियन्त्रणको लागि फोहोर मैला व्यवस्थापन तथा सरसफाई कार्य निरन्तरता ।
- * अनाथ तथा असहाय बालबालिकालाई आर्थिक सहयोग गरिएको ।
- * बिपद् व्यवस्थापनको लागि बिभिन्न सामाग्रि बितरण गरिएको ।
- * सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यमा सहजता ।
- * प्रत्येक साविक वडामा घरधुरी सर्वेक्षण, घर नं कायम गरी अभिलेख राखिएको ।
- * महिला तथा कृषि समुहको गठन गरिएको ।

४. शाखागत वा वडागत रुपमा गरिएका नियमित कार्यहरुको तथ्याङ्क सहिकको विवरण

आ.ब २०७९/८० को मासिक राजश्व संकलन

महिना	शिर्षक	वडा नं ०६	कैफियत
साउन	मालपोत	५,८२५	
	अन्यशुल्क	१९,०२०	
भदौ	मालपोत	४,४६८	
	अन्य शुल्क	१७,२२०	
असोज	मालपोत	१,४१३	
	अन्य शुल्क	१५,५२०	
कार्तिक	मालपोत	३,३३६	
	अन्य शुल्क	२३,९००	
मंसिर	मालपोत	६,५६३	
	अन्य शुल्क	३७,५१०	
पुष	मालपोत	७,५४८	
	अन्य शुल्क	३९,६४५	
माघ	मालपोत	१२,३५२	

	अन्य शुल्क	४८,९०५	
फागुन	मालपोत	३४,०००	
	अन्य शुल्क	४०,३०१	
चैत	मालपोत	१८,७२९	
	अन्य शुल्क	५४,८५०	
वैशाख	मालपोत	३०,०७१	
	अन्य शुल्क	३८,७३५	
जेष्ठ	मालपोत	३१,५९४	
	अन्य शुल्क	४२,६६५	
असार	मालपोत	१०,२६६	
	अन्य शुल्क	३२,१३०	

	अन्य शुल्क	४८,९०५	
फागुन	मालपोत	३४,०००	
	अन्य शुल्क	४०,३०१	
चैत	मालपोत	१८,७२९	
	अन्य शुल्क	५४,८५०	
वैशाख	मालपोत	३०,०७१	
	अन्य शुल्क	३८,७३५	
जेष्ठ	मालपोत	३१,५९४	
	अन्य शुल्क	४२,६६५	
असार	मालपोत	१०,२६६	
	अन्य शुल्क	३२,१३०	

आ.व. २०७९/८० को सेवा प्रवाहको स्थिति

विवरण	वडा नं ०६	कैफियत
१ घरबाटो सिफारिस	२५	
२ नाता प्रमाणित	२५०	
३ स्वीकृत घर नक्सा दर्ता पास /सम्पन्न		
४ नागरिकता सिफारीस	२०६	
५ अन्य सिफारिस	५९०	

पञ्जिकरण तर्फ

१ जन्म दर्ता	२१३
२ विवाह दर्ता	१०६
३ मृत्यु दर्ता	६६
४ बसाई सराई	सरि गएको = १४
	सरि आएको = २
५ सम्बन्धविच्छेद दर्ता	१२

५. योजना तथा कार्यक्रम कार्वान्वयनको क्रममा देखिएका समस्या, चुनौति तथा कमजोरिहरु

- * समयमै उपभोक्ता समिति गठन नभई ढिला समिति गठन हुँदा समितिलाई तालिम दिन नसकिएको, जसले गर्दा समितिका अध्यक्षहरु कार्य सम्पन्न गर्न तथा समिति पुस्तक भर्न असहज भयको ।
- * प्रदेशका योजनाहरु गाउँपालिका र वडासँग समन्वय न हुँदा अनुगमन पक्ष फितलो भई काम प्रभावकारी नभएको ।
- * सभै गदा एक किसिमको काम गर्ने भनेर गर्ने तर काम गदा आफ्नो तरिकाले गर्ने ।
- * उपभोक्ता समितिहरु जनश्रमदान गर्न हिचकिचाउने ।
- * जनश्रमदान लागत अनुमानमा मात्र देखाउने काम हुँदै आएको ।
- * स्थानिय स्तरमा दक्ष कामदार नभएको, जसले गर्दा सामान्य कुराहरु पनि बुझ्न, बुझाउन गाह्रो भएको ।
- * कुनै योजनामा आवश्यक्ता भन्दा बढि र कुनैमा कम बजेट राखिएको ।
- * ठेक्का मार्फत संचालन हुने योजना (महालक्ष्मी सल्ले घारी पहिराधारा सडक स्तरउन्नति) बोलपत्र आह्वानमा ढिलाई हुनाले कार्य सम्पादनमा ढिलाई भएको ।

- * तोकिएको समयमा काम नसक्दा बारम्बार म्याद थप गर्नु परेको ।
- * रकम बिनियोजन गर्दा लागत अनुमान आधार नभई हचुवामा रकम बिनियोजन भइएको ।
- * एक बजेटले छुट्टा छुट्टै स्थानमा काम गर्नु पर्ने ।
- * ठेकेदारसँग आफ्नो प्राविधिक नभएको, फिल्डमा प्राविधिक पुग्दा मात्र गुणस्तरिय काम गर्ने ।
- * वडा सचिबलाई योजना अनुगमनमा नबोलाउने र योजनामा वडा सचिवले अनिवार्य हस्ताक्षर गर्नुपर्ने ।

६. बिगतमा देखिएका कमि कमजोरीहरु,समस्या समाधानको निम्ती आगामि दिनको लागी सुझावहरु

- * बजेट बिनियोजन गर्दा लागत अनुमान तयार पारी सोहि अनुरूप बजेट छुट्याउनु पर्ने ।
- * ठेक्कामा जाने योजना भाद्र महिना भित्र सभै गरि असोज महिना भित्र बोलपत्र आह्वान गर्नु पर्ने ।
- * उपभोक्ता समिति समयमै गठन गरि उचित तरिकाले कार्य सम्पन्न अभिमुखिकरण तालिम दिनुपर्ने ।
- * ठेकेदारलाई तोकिएको समयमा कार्यसम्पन्न गर्न दवाव दिने ।
- * बिबिध कारण म्याद थप गर्नुपरे कामको अबस्था र समयको उपलब्धता हेरि थप गर्ने, उक्त थप समयमा कार्यप्रगति सन्तोष जनक नपाईए, कार्य सम्पन्न नभए नियमानुसार जरिवाना लगाउने ।
- * संघ र प्रदेशका योजनाहरुको अनुगमन पालिका र वडा मार्फत गराउनु पर्ने ।
- * जनश्रमदानको महत्व बुझाउन स्थानिय स्तरमा जनचेतनात्मक कार्यक्रम संचालन गर्नु पर्ने ।

बुढाथुम बेशी ओडारे हटिया महालक्ष्मी सडक स्तरउन्नति



बृहत बसेरी खा.पा, २० घ.मी फेरो सिमेन्ट ट्याङ्कि



तिनखण्डे मजुवा डाँडागाँऊ भैसे सडक स्तरउन्नती



आहालडाँडा अधेरीखोला हे.पो सडक स्तेरउन्नति



धन्यवाद ।

प्रस्तोतकर्ता: बिपना साउद (वडा सचिव)



तपाईंहरुको केहि जिज्ञासा ??

नमस्कार

न - नम्रतापूर्वक
म - मर्यादाका साथ
र - स्वच्छ भावनाले
का - कार्यक्रम सफल पार्न
र - रचनात्मक शैली
अपनाऔं ।

मान बहादुर बोहरा, शिक्षा अधिकृत
गंगाजमुना गाउँपालिका



वार्षिक प्रतिवेदन समिक्षा आ.व. २०७९/०८०

प्रतिवेदक

गंगाजमुना गाउँपालिका
शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा

बिद्यालय, शिक्षक, बिद्यार्थी विवरण

	बिद्यालय	शिक्षक						बिद्यार्थी	
		दरवन्दी	राहत	संघीय अनुदान	प्रदेश अनुदान	पालिका अनुदान	जम्मा	२०७९	२०८०
उमावि	५	१०					१०	३४७	२६३
मावि	६	१६	७	६	३	९	४१	७२०	६१०
निमावि	३	२१	११	२		४	३८	१०६४	९७६
प्रावि	२९	११३	३०			७	१५०	१६६८	१४९४
बालबिकास	०	४५					४५	५९०	४९३
जम्मा	४३	२०५	४८	८	३	२०	२८४	४३८९	३८३६

आ.व. २०७९/०८० को बजेट खर्च

	बिनियोजित बजेट (रु हजारमा)	खर्च (रु हजारमा)	खर्च प्रतिशत (१००% मा)
संघिय सरकार	१७९३९७	१७१३७९१	९५.५३%
प्रदेश सरकार	१७०४	१४१५	८३.०४%
गाउँपालिका	१९३२०	१६०५५	८३.१०%
जम्मा	२००४२१	१८८८४९	९४.२३%

શિર્ષકગત નિકાસા (રૂ હજારમા)

તલબ	પ્રતિ બિદ્યાર્થી લાગત	છાત્રવૃત્તિ	પાઠ્યપુસ્તક	દિવા ખાજા	મસલન્દ	લેખાપરિક્ષ ણ લગાયત અન્ય	ભૌતિક પુર્વાધાર	સેનેટરી પ્યાડ, કમ્પ્યુટર લગાયત અન્ય
૧૫૦૩૬	૨૬૧૦	૬૨૮	૨૩૫૫	૬૪૧૨	૮૭૦	૧૪૯૯	૨૦૬૬૫	૩૪૪૯

सम्पन्न गरेका मुख्य कार्यक्रम

- शिक्षकहरुलाई प्रश्न पत्र निर्माण, IEMIS, ICT सम्बन्धी तालिम
- बिद्यालयको स्थलगत अनुगमन
- शैक्षिक कार्य पात्रो निर्माण
- स्थानिय पाठ्यक्रम निर्माण
- सिकाइ उपलब्धी परिक्षण
- राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता
- बिद्यार्थी अतिरिक्त क्रियाकलाप

मुख्य उपलब्धीहरू

- स्थलगत अनुगमन गरेर ५० वटा बाट ४३ वटामा बिद्यालय समायोजन गरिएको, वडा नं १ र २ का बिद्यालयमा शिक्षक थप व्यवस्थापन गरिएको
- स्थानीय पाठ्यक्रम (हाम्रो गंगाजमुना) निर्माण गरी शैक्षिक सत्र २०८० देखि परीक्षणको रुपमा लागु गरिएको
- कक्षा (१-३) सम्म पाठ्यक्रम प्रबोधिकरण गरी निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणाली लागु गरिएको
- एक बिद्यालयमा एक जना कम्प्युटर स्रोत शिक्षकलाई ICT तालिमको व्यवस्था गरी प्रशासनिक कार्यहरु पेपरलेस बनाउन सुरु गरिएको
- अस्थायी शिक्षकहरुको छनौट प्रक्रियालाई निष्पक्ष, प्रतिस्पर्धात्मक र व्यवस्थित बनाइएको

चुनौती तथा समस्याहरू

- भौगलिक विकटता र शाखामा कामको चाप बढि भएकोले नियमित बिद्यालय अनुगमन गर्न अफ्ठ्यारो भएको
- शिक्षकहरू गाउँपालिकाबाट बाहिर जान खोज्ने संख्या बढि भएकोले दरवन्दी खाली रहने
- बिद्यालयको अनुपातमा शिक्षक दरवन्दी कम रहेको
- बिद्यार्थी संख्या घट्दो क्रममा रहेको
- बिद्यालयमा भौतिक पूर्वाधारको अभाव
- भौगलिक विकटताका कारण शिक्षक तालिम सञ्चालन गर्न अफ्ठ्यारो


यस वर्षको प्रयास...

- प्रत्येक बिषयको ७/७ जनाको बिषयगत रोष्टर निर्माण गरी प्रश्नपत्र निर्माण र नमूना कक्षा प्रदर्शनको लागि जिम्मेवार बनाइएको
- सामुदायिक सिकाइ केन्द्रलाई सक्रिय बनाउन साक्षरता सम्बन्धी तथ्याङ्क संकलन र वडामा शिक्षा सम्बन्धी कार्यको जिम्मेवारी दिइएको
- यसै आ.व. भित्र सबै शिक्षकलाई ICT सम्बन्धी आधारभुत तालिम दिन कार्य सुरु गरिएको
- शिक्षक सेवा तथा लोक सेवाको निशुल्क तयारी कक्षा सञ्चालन गरिदै
- एउटा बिद्यालयमा नमूनाको रूपमा बिद्यालय समय पश्चात बिद्यार्थीको रुची अनुसरको क्रियाकलाप सिकाइदै

धन्यावाद !!!



वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन



आ.व. २०७९/८०

क्र.स.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित रकम	खर्च रकम	उपलब्धिहरु	कैफियत
१	तलव तथा सुबिधा वित्तीय साक्षरता सहजकर्ता कार्यक्रम	४,४६,०००	४,४६,०००		
२	तलव तथा सुबिधा मानोसामाजिक परामर्श कार्यक्रम	४,४६,०००	४,४६,०००		
३	रिटर्नी स्वयंसेवक परिचालन	६,३२,०००	६,३२,०००	३ जना परिचालन गरि २३४८ जनालाई बैदेशिक रोजगारी र विविध जानकारी प्रदान गरियो ।	
४	सामी परियोजना कार्यान्वयनको लागि स्थानीय सरकारको पदाधिकारी संग समन्वय बैठक	४०,०००	४०,०००		
५	सरोकारवालाहरु संगको अन्तरक्रिया तथा अभिमुखिकरण कार्यक्रम (प्रहरी,पत्रकार/मेडिया परिचालन स्थानीय जनप्रतिनिधि स्थानीय तहको विषयगत शाखा जस्तै स्वास्थ्य शाखाका सदस्यहरु/स्थानीय तहमा मनोसामाजिक विषयको दिगोपन/समुदायका अगुवाहरु लाई आप्रवासनको असर तथा प्रभाव का.	७६,०००	७६,०००	१३३ जना स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु र सरोकारवाला हौं संग अन्तरक्रियात्मक तथा अभिमुखी कार्यक्रम संचालन गरियो ।	
६	बैदेशिक रोजगारीमा जना चाहने सम्भावित कामदारहरु लाई गहन अभिमुखिकरण कार्यक्रम	३,०००	३,०००	३० जनालाई गहन अभिमुखिकरण कार्यक्रम संचालन गरियो ।	
७	वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम संचालन खर्च	२,२५,०००	२,२५,०००	१०४ जनालाई वित्तीय साक्षरता तथा मनोसामाजिक परामर्श कक्षामा सहभागी गराई कक्षा संचालन गरियो ।	
८	मनोसामाजिक परामर्श संचालन खर्च	९३,०००	७५,०००	१०४ जनालाई सामुहिक परामर्श र ३४ जनालाई प्रति व्यक्ति घरभेट गरि मनोसामाजिक परामर्श गरिएको छ ।	
९	सम्बन्धित सरोकारवालाहरु बाट परियोजना अनुगमन तथा मुल्यांकन	४०,०००	४०,०००		
१०	आप्रवासी श्रोत केन्द्रको कार्यालय संचालन कर्मचारी भ्रमण खर्च/शिरोभर खर्च	७७,०००	७५,०००		
११	स्थानीय तहमा क्रियाशील कामदार संचालनलाई सामाग्री सहयोग	१०,०००	०		



व्यक्तिगत मनोसामाजिक परामर्शको केहि झलकहरु



वित्तिय तथा मनोसामाजिक परामर्श कक्षाको केहि झलकहरु



वित्तीय तथा मनोसामाजिक परामर्श कक्षाको समापन केहि झलक
